7 Fases AMBA

Adquisición Estratégica de Equipamiento Crítico para el Proyecto AMBA I

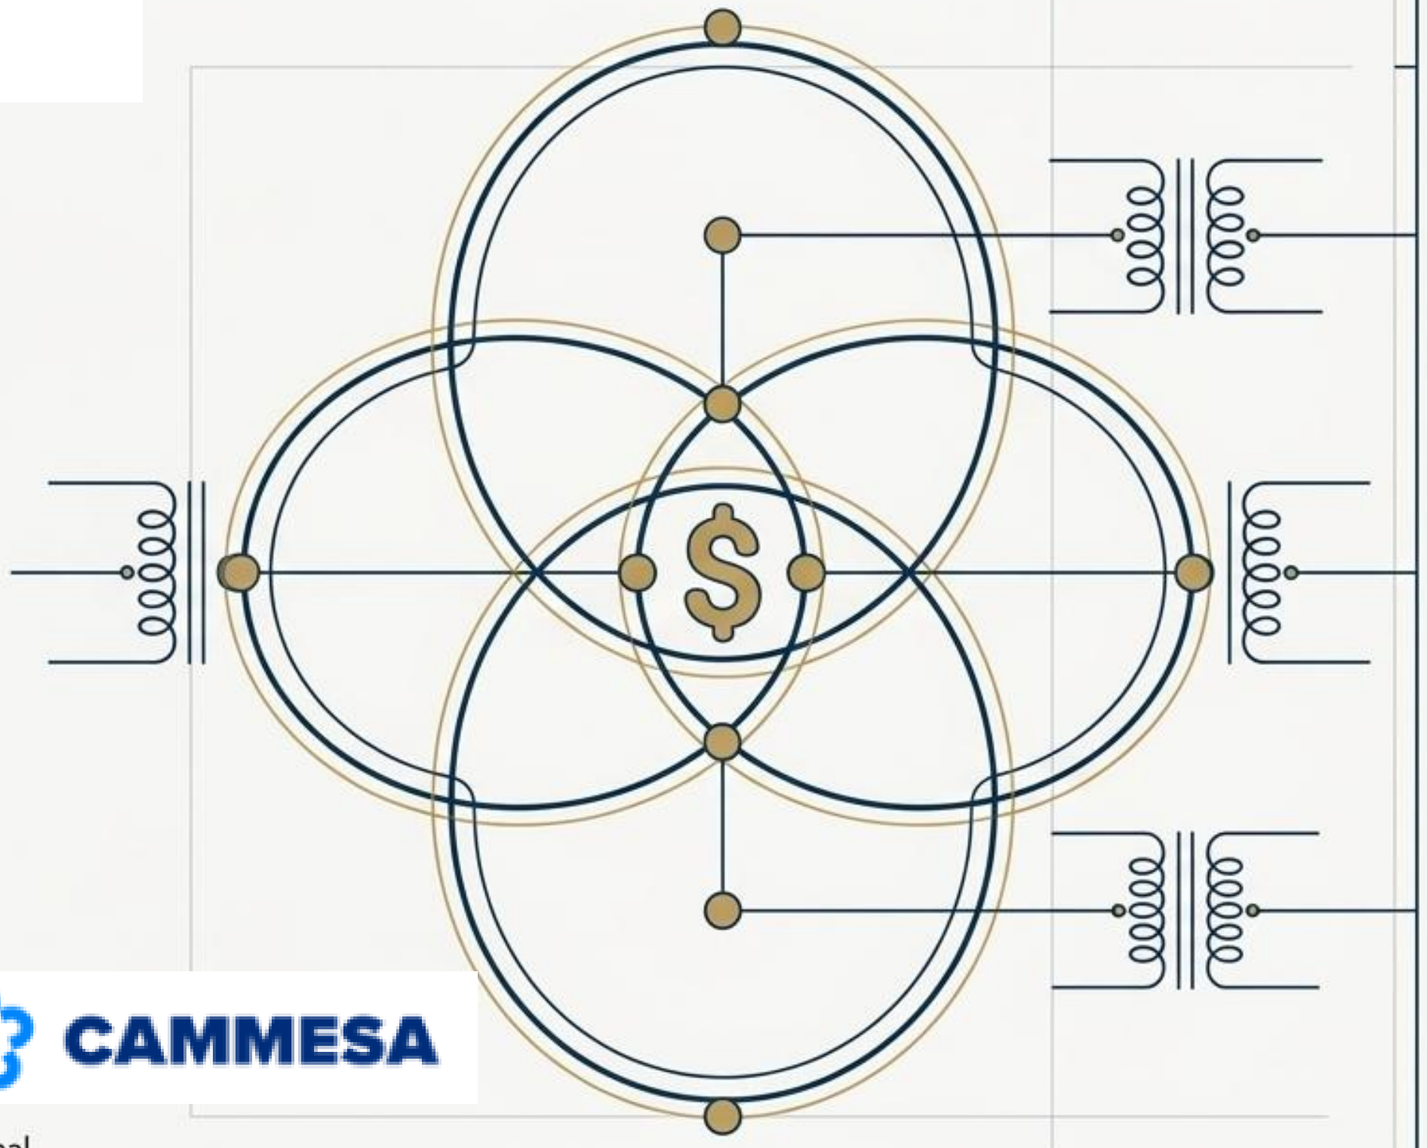

CAMMESA

Resolución SE Nº 218/2026 – Licitación Pública Nacional e Internacional.

Gemini Notebook

El Eslabón Crítico: Abasteciendo al Área GBA

Contexto Operativo

La ET Ezeiza, actual nodo principal de abastecimiento, opera próxima a su límite de capacidad de transformación.

La Solución (AMBA I)

Reconstrucción integral del Sistema Argentino de Transmisión (Líneas 500/220/132 kV).

El Foco (ET Plomer)

Corazón de la Etapa 1 del proyecto. Requiere una habilitación comercial en un plazo de 40 meses, exigiendo un ingreso masivo de nueva energía y potencia al sistema.

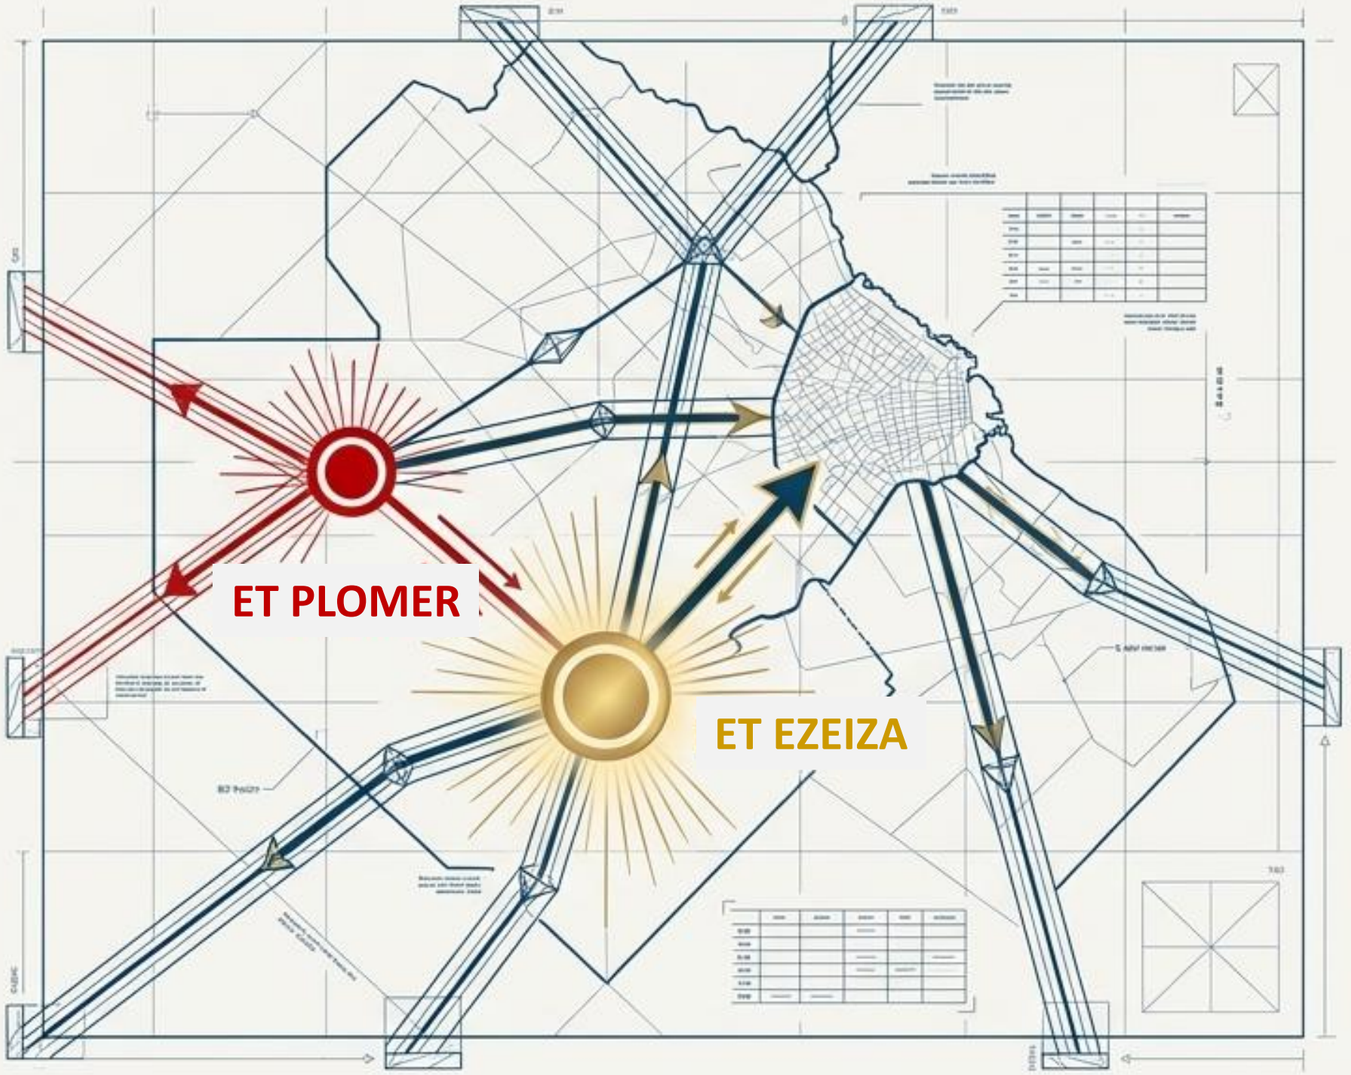

Foco Operativo: Anticipando el Cuello de Botella Global

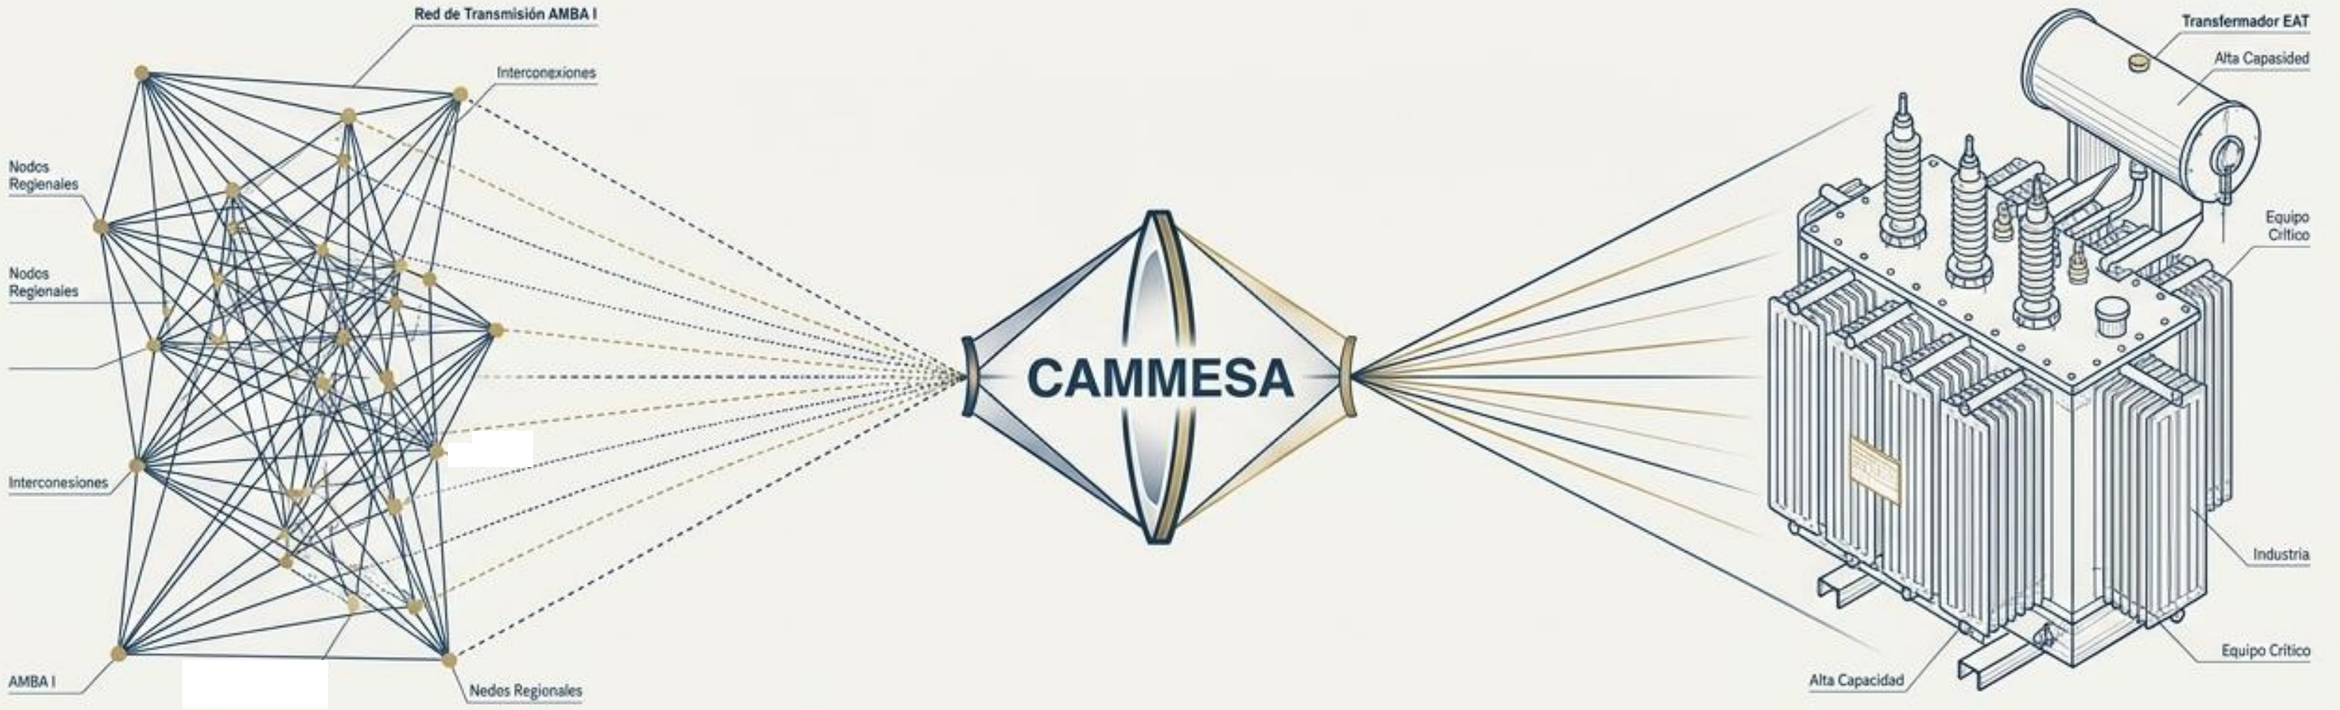

1 El Desafío

Restricciones severas en la cadena de suministro global para equipamiento de extra alta tensión (plazos de entrega extendidos).

2 La Instrucción

Resolución SE N° 218/2026.
Se instruye a CAMMESA a ejecutar una licitación pública nacional e internacional para la provisión anticipada.

3 El Objetivo

Asegurar la disponibilidad de los equipos más críticos (transformadores) para garantizar el cumplimiento del cronograma de 40 meses de la futura ET Plomer, desriesgando la Etapa 1 de AMBA I.

Gemini Notebook

800. 585 3524
(41) 2327 3452

Transformadores de Potencia Monofásicos
$500/\sqrt{3}$ - $231/\sqrt{3}$ - 34,5 kV | 285/285/16,67 MVA por unidad

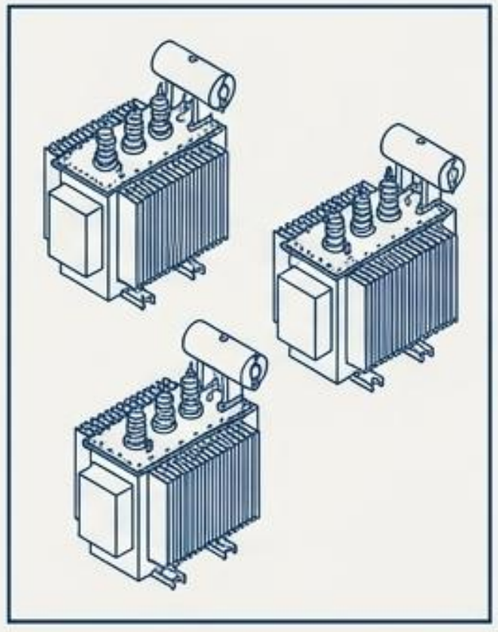

Banco 1
(855 MVA)

+

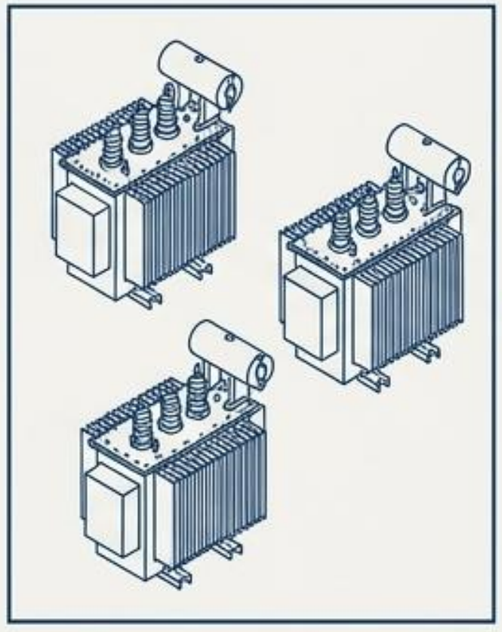

Banco 2
(855 MVA)

+

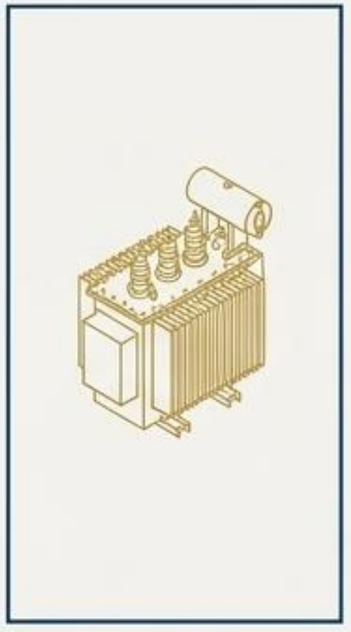

Fase de Reserva
Estratégica

=

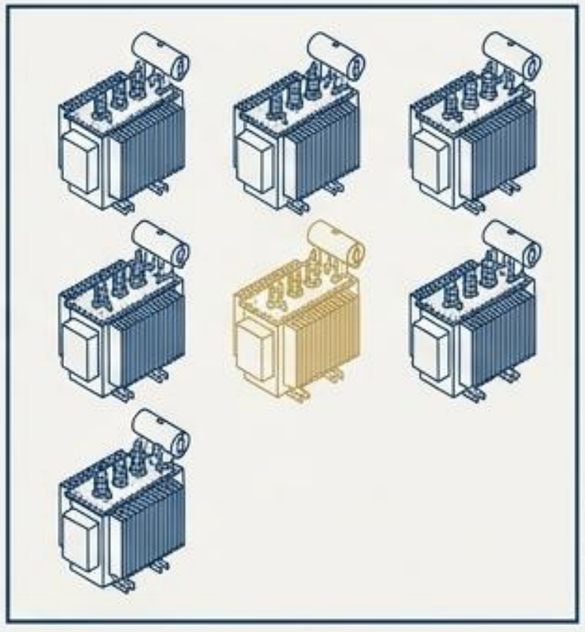

7 Transformadores
Total

Gemini Notebook

Flexibilidad de Oferta: Agrupación Estratégica

Ítem A

Cuatro (4) transformadores.
(Incluye subítem A1y2: Supervisión de Montaje y Ensayos).

Ítem B

Tres (3) transformadores.
(Incluye subítem B1y2: Supervisión de Montaje y Ensayos).

Ítem C

Oferta conjunta por los Siete (7) transformadores.

Regla de Adjudicación: CAMMESA se reserva el derecho exclusivo de adjudicar los Ítems A y B por separado, o en su totalidad a un único proveedor a través del Ítem C.

Gemini Notebook

CAMMESA

Sistema de Doble Sobre y Barreras de Entrada

Sobre A (Técnico)

Barrera Excluyente: Homologación obligatoria por Transener S.A. bajo la Especificación Técnica TR-10.3. Ofertas sin este requisito serán descartadas.

Respaldo Financiero:
Garantía de mantenimiento de oferta de USD 100.000 por cada fase ofertada (Aval bancario o seguro de caución a primer requerimiento).

Capacidad:
Presentación de balances certificados y lista de provisiones similares.

Sobre B (Económico)

Estructura de Cotización:
Precios fijos y definitivos expresados en USD, sin admitir fórmulas de ajuste o redeterminación.

Condición Impositiva:
Separación estricta del IVA en la planilla de cotización.

Cotización CIF (si es importado)

Gemini Notebook

CAMMESA

Estructura Financiera de Pagos (Sin Fórmulas de Ajuste)

Industria Nacional

30% a la aceptación de la Orden de Compra (OC).



20% fin de Bobinados / **10%** fin de Núcleo.



20% finalización exitosa de Ensayos.

15% a los 30 días de entrega Puerta de Fábrica.

5% a los 30 días del Montaje.

Industria Internacional

30% a la aceptación de la Orden de Compra (OC).

50% contra evidencia de embarque (Valor FOB).



75% del saldo a 30 días de entrega CIF (Puerto Zárate, Bs. As.).

25% del saldo a 30 días del Montaje en sitio.

Gemini Notebook

Cronograma de Fabricación y Logística de Entrega

Ventana de Ejecución

Mínimo: 24 Meses

Máximo: 30 Meses

Condiciones de Entrega (Incoterms)

Origen Internacional

CIF Puerto de Zárate, Buenos Aires, Argentina.

Origen Nacional

Entregado en “puerta de fábrica”, listo para transporte en carretón.

Garantía Técnica: 24 meses a partir de la puesta en servicio, o 30 meses desde la recepción de los equipos (lo que ocurra primero).

Gemini Notebook

CAMMESA

El Cronograma Licitatorio: La Carrera Hacia la Adjudicación

14 Octubre:
Lanzamiento oficial del llamado a licitación.

29 Octubre:
Límite para la recepción de consultas.

20 Noviembre:
Recepción formal de Ofertas (Sobres A y B).

02 Diciembre:
Comunicación de Evaluación Técnica (Sobre A).

04 Diciembre:
Apertura de Oferta Económica (Sobre B).

09 Diciembre:
Emisión del dictamen de Adjudicación Formal.

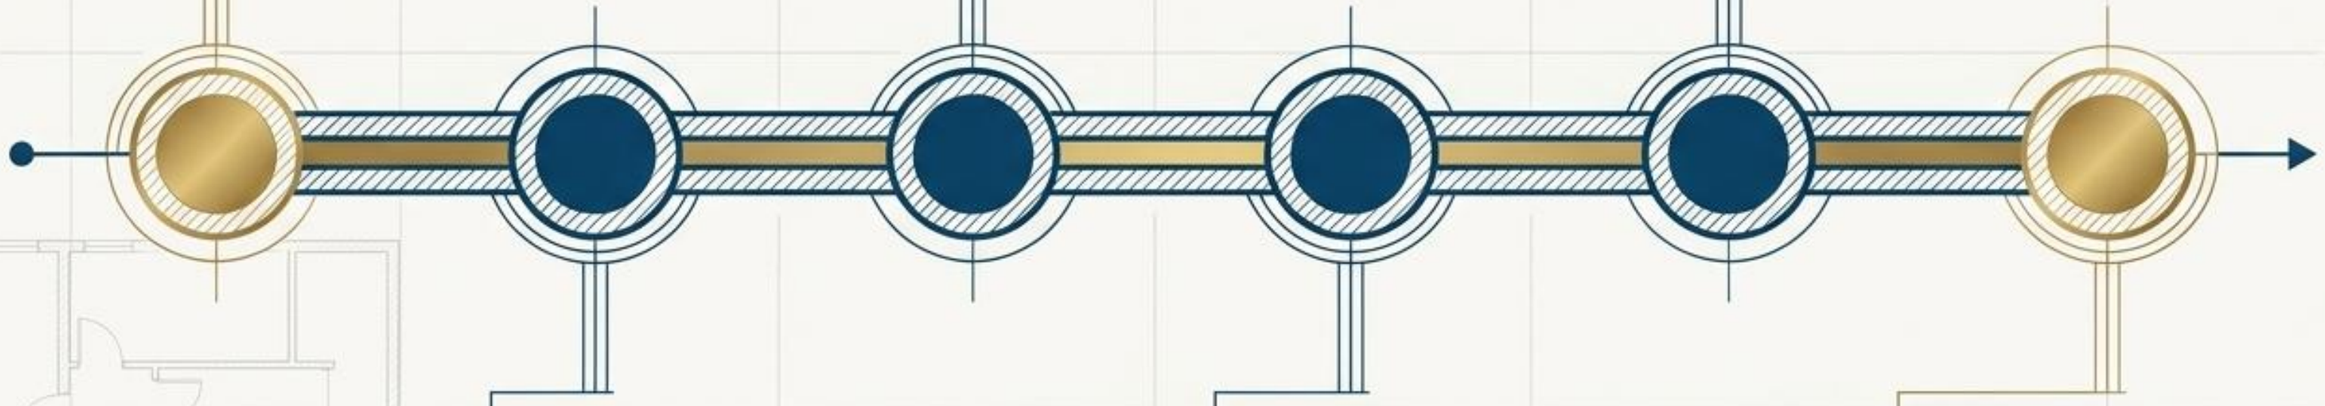

Gemini Notebook

CAMMESA

El Eslabón Contractual: Integración Estratégica con AMBA I

Orden de Compra

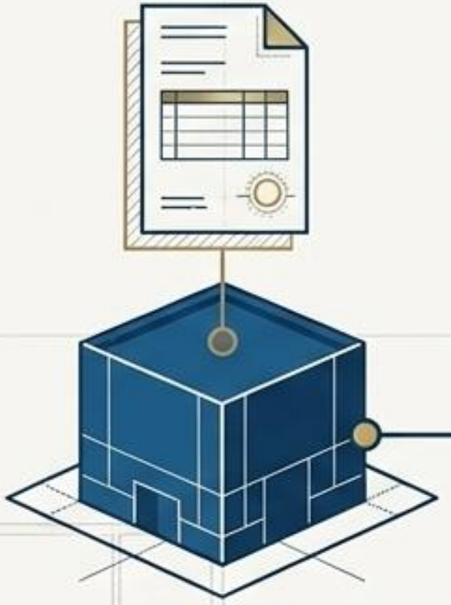

El Mecanismo: Cesión gratuita de la posición contractual

(Artículo 21 Anexo B)

CAMMESA
(Adjudicador Inicial)

Concesionario AMBA I
(VPU) - Sector Privado

Síntesis de Valor: Este andamiaje jurídico permite al Estado asegurar hoy equipamiento crítico globalmente escaso, transfiriendo posteriormente el activo y los beneficios fiscales (RIGI) al sector privado, garantizando la viabilidad financiera y los plazos de la obra.

Gemini Notebook

CAMMESA

COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO S.A.

https://cammesaweb.cammesa.com/7-fases-amba/
